

HAKKÂRİ İL YATIRIMLARI

HAKKÂRİ MERKEZ

(Proje Bedeli 1.000.000 TL ve Üzeri Yatırımlar)

Projenin Yeri:	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Belediyesi
Projenin Adı:	Hakkâri Merkez İçme Suyu İsale Ve Şebeke Yapım İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri:	2016-2018
Proje Tutarı:	35.000.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme:	% -
Fiziki Gerçekleşme:	% 65



Projenin Yeri:	Hakkâri/ Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Belediyesi
Projenin Adı	Hakkâri Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	24.000.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 25
Fiziki Gerçekleşme	% 40




Projenin Yeri	Hakkâri / Merkez
Projenin Sahibi	İl Sağlık Müdürlüğü
Projenin Adı	20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapımı
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2017
Proje Tutarı	6.236.300,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 60
Fiziki Gerçekleşme	% 95



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Projenin Sahibi	TEİAŞ
Projenin Adı	145 kv Kırıkdağ-Yüksekova E.İ.H.
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2017
Proje Tutarı	17.000.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Üzümcü Ayr. Geçitli Yolu (DAP)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2019
Proje Tutarı	23.320.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 1

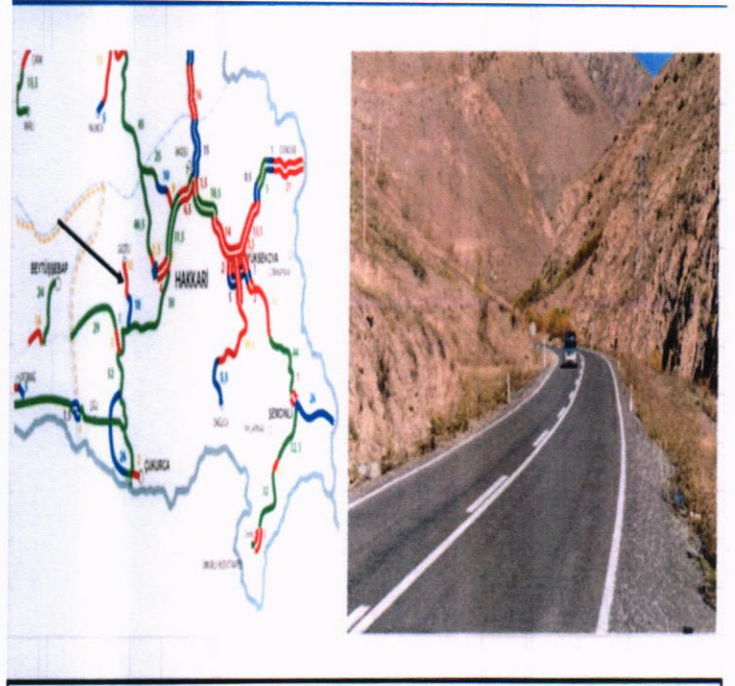

Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Hakkâri Merkez 112 Acil Çağrı Merkezi Yapım İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2016
Proje Tutarı	2.442.600,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 49
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Hakkâri Merkez İş Geliştirme Binaları Yapım İşİ
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016
Proje Tutarı	6.490.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 51
Fiziki Gerçekleşme	% 65



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Hakkâri Jandarma Yeniköprü Emniyet Depin Güvenlik Geçici Kontrol Noktaları Yapım İşİ
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2017
Proje Tutarı	1.200.174,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 30



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Hakkâri İli Merkez Otluca Tugay Yolu Beton Yol Yapım İşİ
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2017
Proje Tutarı	1.121.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100



Projenin Yeri	Hakkâri/ Merkez
Proje Sahibi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Projenin Adı	Kız Meslek Lisesi 24 Derslik, 300 Kişilik Pansiyon, 10 Daireli Lojman, Anaokulu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2017
Proje Tutarı	12.683.821,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 90
Fiziki Gerçekleşme	% 95



Projenin Yeri	Hakkâri/ Merkez
Proje Sahibi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü (TOKİ)
Projenin Adı	Ticaret Meslek Lisesi 24 Derslik (TOKİ)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2017
Proje Tutarı	5.500.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 0
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/ Merkez
Proje Sahibi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Projenin Adı	Fen Lisesi 16 Derslik, 200 Kişilik Pansiyon
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2017
Proje Tutarı	9.180.310,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 70
Fiziki Gerçekleşme	% 73



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Genç Çiftçi Projeleri
Başlama ve Bitiş Tarihleri	06.2017-11.2017
Proje Tutarı	5.910.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 0,5
Fiziki Gerçekleşme	% 0,5




Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Hakkâri Merkez Spor Salonu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2017
Proje Tutarı	13.000.000,00 (Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi)
Nakdi Gerçekleşme	% 80
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Hakkâri Merkez Gençlik Merkezi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2017
Proje Tutarı	13.000.000,00 (Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi)
Nakdi Gerçekleşme	% 80
Fiziki Gerçekleşme	% 95



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Hakkâri 1500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2012-2017
Proje Tutarı	1.500.000,00
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 70

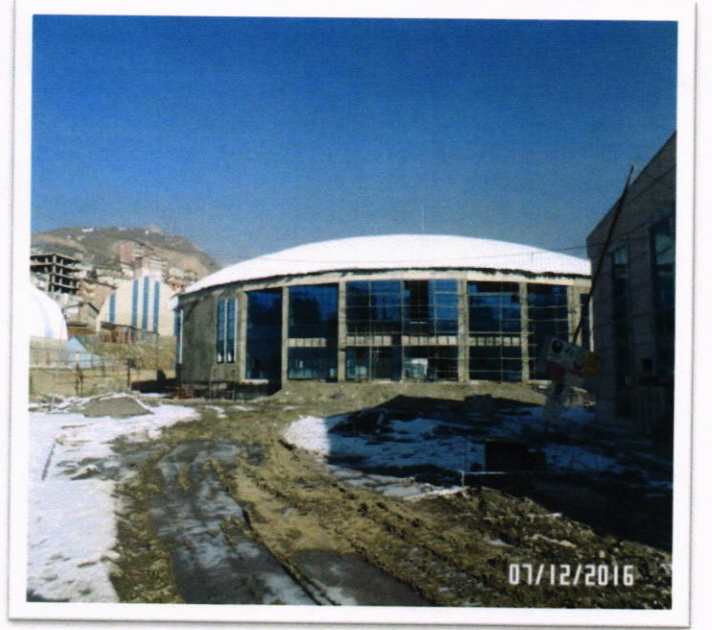

Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Hakkâri Kapalı Yüzme Havuzu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2017
Proje Tutarı	1.500.000,00
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Proje Sahibi	Hakkâri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Hakkâri Gençlik Merkezi Binası
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2014-2017
Proje Tutarı	1.000.000,00
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez ve ilçeler
Proje Sahibi	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (DAP)
Projenin Adı	DAP (30 proje)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2017
Proje Tutarı	4.948.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% : 13
Fiziki Gerçekleşme	% : 50



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez ve ilçeler
Proje Sahibi	Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü (DAP)
Projenin Adı	DAP (162 proje)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2016
Proje Tutarı	31.115.653,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 76
Fiziki Gerçekleşme	% 81



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Projenin Sahibi	VEDAŞ
Projenin Adı	Şehir Şebekesi 15 Kv/34.5kv Fider 3-4 Gerilim Dönüşümü İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2017-2017
Proje Tutarı	4.615.609,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	%
Fiziki Gerçekleşme	% 30



Projenin Yeri	Hakkâri/Merkez
Projenin Sahibi	Hakkâri Üniversitesi
Projenin Adı	Hakkâri Üniversitesi Sosyal Tesis Binası Onarım, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İnşaatı Yapım İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2017-2017
Proje Tutarı	2.680.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 22
Fiziki Gerçekleşme	% 50



YÜKSEKOVA İLÇESİ

(Proje Bedeli 1.000.000 TL ve Üzeri Yatırımlar)


Projenin Yeri	Hakkâri/ Yüksekova
Projenin Sahibi	Yüksekova Belediyesi
Projenin Adı	İçme Suyu İnşaatı
Başlama ve Bitiş Tarihleri	20.01.2017 10.08.2018
Proje Tutarı:	55.294.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 17
Fiziki Gerçekleşme	% 17



Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Projenin Sahibi	Yüksekova Belediyesi
Projenin Adı	Kanalizasyon Ve Yağmursuyu İnşaatı Yapım İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	27.273.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 5
Fiziki Gerçekleşme	% 5



Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Projenin Sahibi	DSİ 17. Bölge
Projenin Adı	Dilimli Barajı
Başlama ve Bitiş Tarihleri	1995-2017
Proje Tutarı	164.646.693,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 98
Fiziki Gerçekleşme	% 98

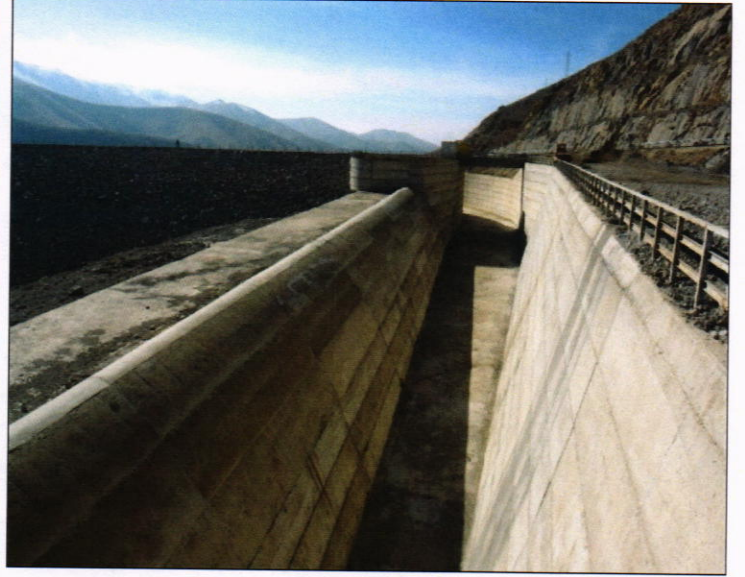

Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Proje Sahibi	Hakkâri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Projenin Adı	Y.ova Sosyal Hizmet Merkezi ve çevre imalatları yapım işi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2017-2018
Proje Tutarı	2.491.500,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 10
Fiziki Gerçekleşme	% 11



Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Proje Sahibi	Hakkâri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Projenin Adı	Y.Ova İlçesinde Hasar Gören Binaların 1.Etap Yıkım İşİ
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2017
Proje Tutarı	2.100.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 42
Fiziki Gerçekleşme	% 45



Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Proje Sahibi	Hakkâri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
Projenin Adı	Y.Ova İlçesinde Hasar Gören Binaların 2.Etap Yıkım İşİ
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2017
Proje Tutarı	2.098.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 29
Fiziki Gerçekleşme	% 32



Projenin Yeri	Hakkâri/ Yüksekova
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Yüksekova Çevre Yolu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2013-2018
Proje Tutarı	37.544.619,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 25




Projenin Yeri	Hakkâri/ Yüksekova
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	(Başkale-Hakkâri) Yüksekova-Esendere (DAP)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2005-2018
Proje Tutarı	140.477.513,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 9



Projenin Yeri	Hakkâri/ Yüksekova
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Yüksekova Dağlıca Yolu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2021
Proje Tutarı	81.082.597,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 81




Projenin Yeri	Hakkâri
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	(Başkale- Yüksekova) Ayr. Hakkari Ayr. (DAP)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	1986-2020
Proje Tutarı	23.962.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 13

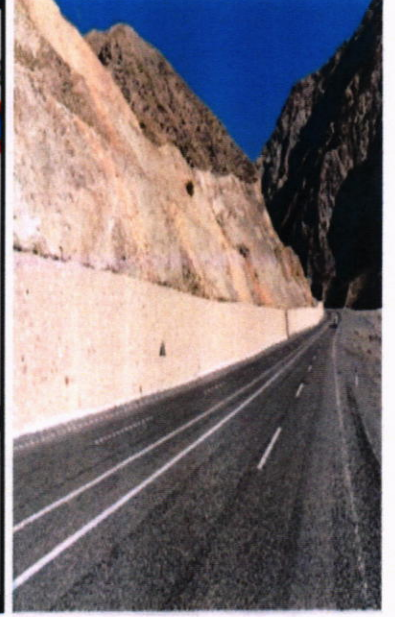

Projenin Yeri	Hakkâri/ Yüksekova
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Dağlıca-Aktütün-Yaylapınar Yolu (1. Kısım)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	266.773.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 1



Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Çobanpınar-Yediveren EsendereYolu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	312.222.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 7

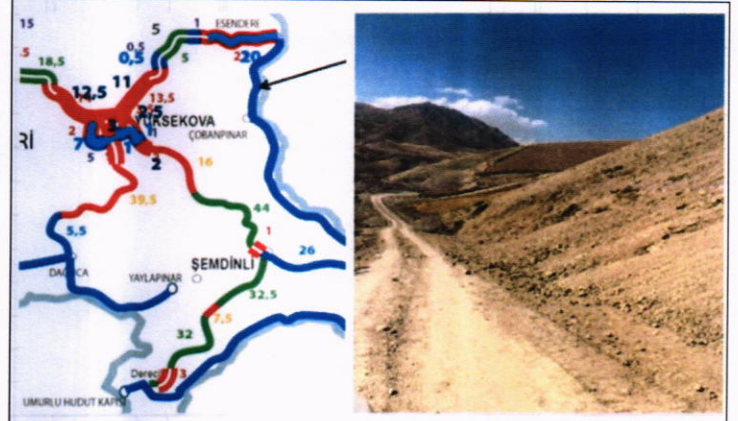

Projenin Yeri	Hakkâri/ Yüksekova
Proje Sahibi	İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Projenin Adı	Onbaşılar Köyü 8 Derslikli İlkokul
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2017
Proje Tutarı	1.505.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 85
Fiziki Gerçekleşme	% 90



Projenin Yeri	Hakkâri/Yüksekova
Proje Sahibi	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Yüksekova Gençlik Merkezi Binası
Başlama ve Bitiş Tarihleri	13.10.2014 – Geçici Kabulü Yapılarak Teslim Alınmıştır.
Proje Tutarı	2.124.000,00
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100




ŞEMDİNLİ İLÇESİ

(Proje Bedeli 1.000.000 TL ve Üzeri Yatırımlar)

Projenin Yeri	Hakkâri/ Şemdinli
Projenin Sahibi	DSİ 17. Bölge
Projenin Adı	Beyyurdu ve Aslandağı Barajları
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2008-2017
Proje Tutarı	67.960.554,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 93
Fiziki Gerçekleşme	% 99



Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Projenin Sahibi	İl Sağlık Müdürlüğü
Projenin Adı	20 Yataklı Derecik Devlet Hastanesi Yapımı
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2018
Proje Tutarı	13.709.240,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 10
Fiziki Gerçekleşme	% 18

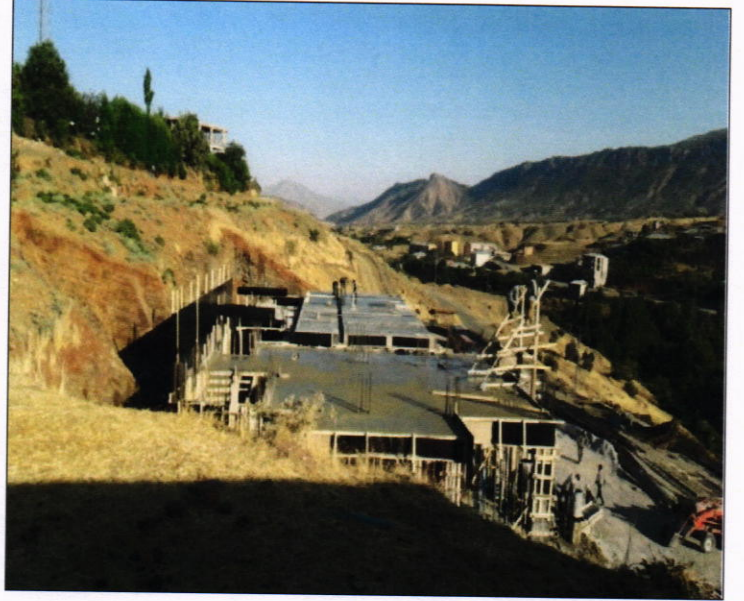


Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Şemdinli- Derecik Umurlu Sınır Kapısı
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2011-2018
Proje Tutarı	76.860.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% -



Projenin Yeri	Hakkâri/ Şemdinli
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Şemdinli Alan İl Yolu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2019
Proje Tutarı	84.065.783,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 66
Fiziki Gerçekleşme	% 80




Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Dağlıca-Aktütün-Yaylapınar Yolu (2. Kısım)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	365.083.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 1

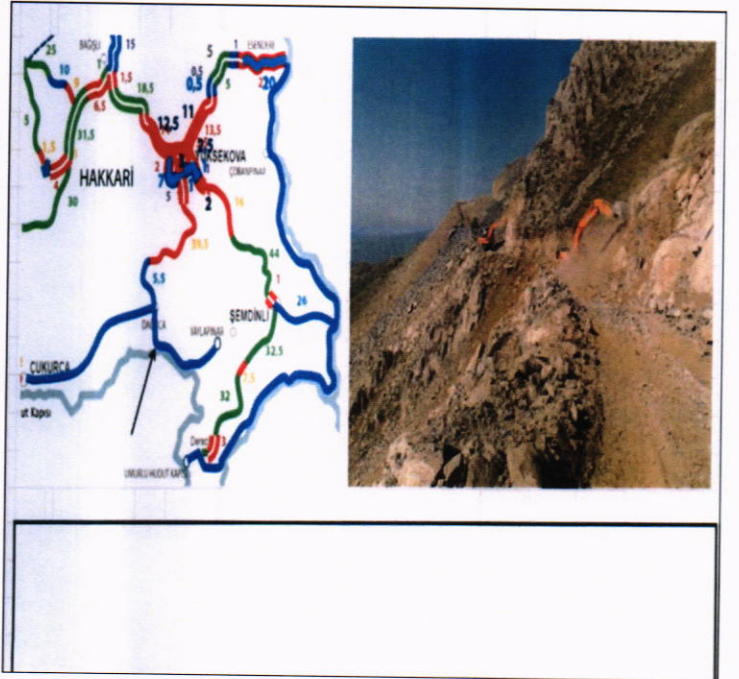

Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Samanlı- Mordaği-Çobanpınar Yolu (1. Kısım)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	108.444.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 1



Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Samanlı- Mordaği-Çobanpınar Yolu (2. Kısım)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	214.905.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 4

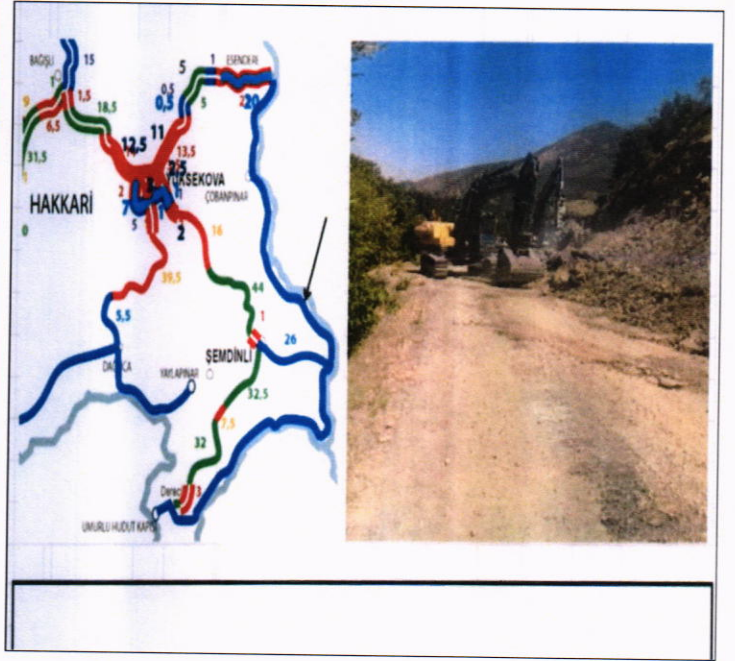

Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Şemdinli Derecik Toplum Merkezi Binası Ve Çevre Düzenleme Yapım İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015
Proje Tutarı	1.608.417,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 29
Fiziki Gerçekleşme	% 32



Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Şemdinli İlçesi Bağlar Köyü Kayme Sarayı Restorasyonu İşi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016
Proje Tutarı	1.803.496,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% 80
Fiziki Gerçekleşme	% 60



Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	İl Özel İdaresi
Projenin Adı	Nehri Bölgesi İnanç Turizmi Koridoru
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2017
Proje Tutarı	5.710.000,00
Nakdi Gerçekleşme	% 28
Fiziki Gerçekleşme	% 28



Projenin Yeri	Hakkâri/Şemdinli
Proje Sahibi	DAKA
Projenin Adı	Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Alt Yapı Modernizasyon Projesi
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	1.484.038,00
Nakdi Gerçekleşme	% 40
Fiziki Gerçekleşme	% 40




ÇUKURCA İLÇESİ

(Proje Bedeli 1.000.000 TL ve Üzeri Yatırımlar)


Projenin Yeri	Hakkâri/Çukurca
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Hakkari –Çukurca İl Yolu Üzümlü Kara Hudut kapısı Yolu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2018
Proje Tutarı	58.775.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 1



Projenin Yeri	Hakkâri/Çukurca
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Çukurca-Dağlıca Yolu (DAP)
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	718.991.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 1

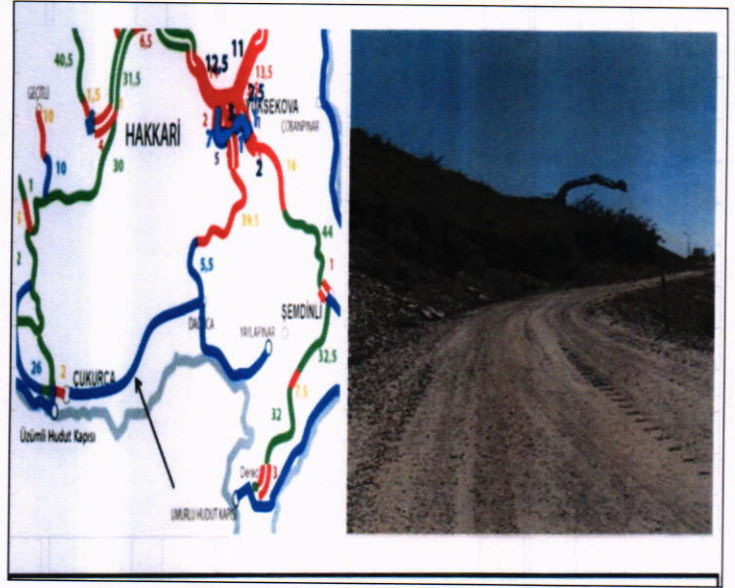

Projenin Yeri	Hakkâri/Çukurca
Proje Sahibi	Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü
Projenin Adı	Serbest Karakolu-Çığılı-Şentepe Üzümlü Yolu
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2016-2018
Proje Tutarı	107.372.000,00 TL
Nakdi Gerçekleşme	% -
Fiziki Gerçekleşme	% 7

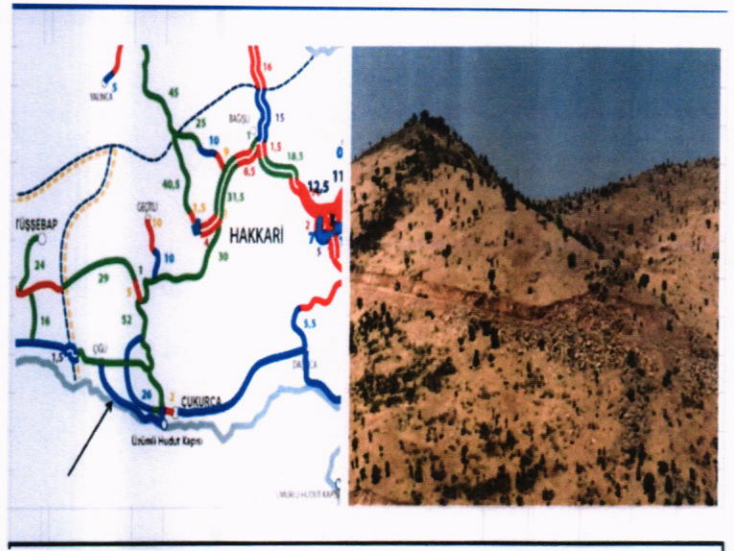

Projenin Yeri	Hakkâri/Çukurca
Proje Sahibi	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
Projenin Adı	Çukurca Gençlik Merkezi Binası
Başlama ve Bitiş Tarihleri	2015-2017
Proje Tutarı	1.735.000,00
Nakdi Gerçekleşme	% 100
Fiziki Gerçekleşme	% 100

